



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n. 03
OPERE A TUTTO IL 05.12.2025

PREMESSO

- Che in data 22.12.2023 con D.D. n. 874 è stato approvato dalla S.A. il progetto Esecutivo di Appalto;
- Che con la Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n.305 del 13.05.2024 è stata determinata l'aggiudicazione definitiva e il contestuale Affidamento dell'appalto dei Lavori di "Realizzazione dell'intervento nuovo polo civico e riqualificazione urbana degli spazi esterni adiacenti" siti a Malnate in Via



Marconi e nelle aree adiacenti all'Impresa Edil Europa S.r.l con sede in Via Sempione, 130 a Torino, P.IVA n.03117750012 con ribasso pari al 14,890%;

- Che in data 17.07.2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n.9668, stipulato a corpo ai sensi del D.Lgs. 36/2023 tra il Comune di Malnate e l'appaltatore;
- Che con il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori del 27.08.2024 sono state avviate le attività di cantierizzazione, senza decorrenza dei termini contrattuali, in attesa del perfezionamento di alcune lavorazioni propedeutiche alla completa attività cantieristica dell'appalto;
- Che in data 01.10.2024 è stata effettuata la Consegna dei Lavori Definitiva, con decorrenza dei termini contrattuali e termine di ultimazione a tutto il 17.01.2026;
- Che in virtù delle obbligazioni di contratto (rif. Punto 3 del Contratto d'appalto) i lavori e le opere in appalto sono da contabilizzarsi a corpo e, ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori sono da contabilizzarsi secondo stati di avanzamento lavori eseguiti, ogni qual volta l'importo lavori maturati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 300.000,00 comprensivi della quota oneri della sicurezza;
- Che per gli oneri di sicurezza è stata acquisita la valutazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Che con gli accertamenti e verifiche di cui sopra, si sono configurate le circostanze previste in contratto per l'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori e pertanto si è proceduto alla compilazione del SAL, del Registro di Contabilità e del relativo Sommario, intendendo che una volta sottoscritti dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, confluiranno tutti nel Registro di Contabilità generale dell'appalto;
- Che per effetto delle disposizioni del CSA l'avanzamento dei lavori viene determinato sulla avvenuta esecuzione da parte dell'Appaltatore delle Categorie omogenee;
- Che avuta conferma della formale approvazione della Perizia di Variante n. 01 e dell'atto di sottomissione relativo con determina n. 540 del 19.08.2025, nel SAL 02 è stata riallineata la contabilità rispetto all'intervenuta Perizia di Variante con assorbimento delle opere in partita provvisoria contabilizzate nel SAL 01 e si è proceduto all'allibrazione degli avanzamenti realizzati;
- Che, l'addendum contrattuale relativo all'emissione della Perizia di Variante n. 01 è stato firmato in data 04/12/2025;
- **Che In data 26/11/2025 l'impresa ha formalmente richiesto l'emissione del SAL 03 sebbene l'avanzamento non avesse ancora raggiunto la soglia minima contrattuale di 300 000,00 € netti. La richiesta, protocollata agli atti del Comune di Malnate al n. 0025990, è stata motivata dalla necessità di aumentare la propria liquidità per far fronte agli impegni presi con i fornitori degli elementi prefabbricati, poiché, non avendo ancora firmato l'addendum contrattuale conseguente all'emissione della Perizia di Variante n. 01, non era ancora stato autorizzato il pagamento del precedente SAL 02 al momento della richiesta.**
- **Che, considerato il contesto e la necessità di garantire la prosecuzione delle forniture, la richiesta è stata ritenuta accettabile da parte della Stazione Appaltante che ha provveduto a dare autorizzazione formale per la predisposizione della contabilità per l'emissione del SAL n. 03 protocollata agli atti al n. 26704. La Direzione Lavori ha pertanto proceduto alla verifica della contabilità e alla conseguente emissione del presente SAL.**



TUTTO CIÒ PREMESSO

Accertate le condizioni generali e particolari per l'emissione del SAL 03 per lavori a tutto il 05.12.2025, il sottoscritto ing. Antonio PRESICCE, nella qualità di Direttore Lavori Generale delle opere relative all'appalto in epigrafe:

DISPONE L'EMISSIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 03

come di seguito allegato, per l'importo lavori GLOBALE (al lordo dello sconto di gara) pari a 924 807,21 € (novecentoventiquattro ottocentosette/21) di cui 13 766,33 € per oneri della sicurezza e 200 670,79 € per costi della manodopera non soggetti a ribasso, corrispondente al **18,87% di avanzamento totale** sull'importo di contratto dei lavori, rivalutato per effetto della PdV01.

L'avanzamento percentuale rispetto al precedente SAL è pari al 4,40%.

Importo lavori in appalto post PDV01	4 902 090,92 €
Sconto di gara	14,89%
Importo oneri della sicurezza	99 541,48 €
Importo costi della manodopera post PDV01	1 113 969,30 €
Importo contrattuale post PDV01	4 352 861,34 €

(1) Progressivo importo lavori SAL03 come da contabilità	215 682,23 €
(2) di cui Importo oneri sicurezza contabilizzati SAL03	6 479,97 €
(3) di cui Importo costi della manodopera contabilizzati SAL03	47 551,49 €
(4) Importo lavori SAL03 soggetto a ribasso (1)-(2)-(3)	161 650,77 €
(5) A dedurre ribasso di gara pari al 14,89% sull'importo del punto (4)	24 069,80 €
(6) Importo lavori SAL03 al netto dello sconto (4)-(5)	137 580,97 €

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO SOGLIA CONTRATTUALE SAL > 300 000,00 € NETTI	
Importo netto SAL03 (2)+(3)+(6)	191 612,43 €*

***Il presente SAL non raggiunge la soglia contrattuale prevista, tuttavia, come precedentemente esplicitato, la Stazione Appaltante ha ritenuto accettabile la richiesta dell'impresa di anticipare l'emissione del SAL n. 03.**

A seguire il riepilogo in dettaglio delle lavorazioni eseguite al 05/12/2025:

MACRO CATEGORIE		SAL 03			TOTALE AVANZAMENTO		
	CATEGORIE OPERA	%SAL	IMPORTO	(di cui IMO)	%SAL	IMPORTO	(di cui IMO)
OPERE EDILI		0,70%	11 831,62 €	3 396,43 €	5,92%	100 434,75 €	20 384,27 €
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI	0,00%	0,00 €	0,00 €	91,97%	75 267,69 €	13 223,40 €
2	DRENAGGI E RINTERRI	40,00%	5 982,25 €	1 513,30 €	80,00%	11 964,50 €	3 026,60 €
3	MURATURE ESTERNE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
4	MURATURE INTERNE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
5	VESPAIO SOTTOFONDI E MASSETTI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
6	ISOLAMENTI E MEMBRANE	0,61%	879,44 €	125,20 €	0,61%	879,44 €	125,20 €
7	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
8	CONTROSOFFITTI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €

COMUNE DI MALNATE (VA)

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI

CIG: B0D4DC26D4 | CUP: B23B19000220004 | DETERMINA N. 874 DEL 22/12/2023



9	OPERE DA SERRAMENTISTA	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
10	OPERE DA FABBRO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
11	OPERE DA FALEGNAME	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
12	OPERE DI COPERTURA E DA LATTONIERE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
13	OPERE DA DECORATORE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
14	OPERE ACCESSORIE E SERVIZI IGIENICI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
15	OPERE DA POZZATTIERE	0,79%	299,53 €	30,53 €	5,39%	2 048,25 €	208,79 €
16	ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
17	OPERE ESTERNE PAVIMENTAZIONI E OPERE DEL VERDE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
18	NOLEGGI	25,00%	4 670,40 €	1 727,40 €	55,00%	10 274,88 €	3 800,28 €
OPERE STRUTTURALI		12,34%	194 645,26 €	43 508,31 €	51,08%	805 742,79 €	179 199,08 €
19	OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI	25,54305%	7 193,15 €	1 333,92 €	25,54%	7 193,15 €	1 333,92 €
20	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI	0,00%	0,00 €	0,00 €	100,00 %	80 209,63 €	33 583,26 €
21	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	0,00%	0,00 €	0,00 €	100,00 %	296 820,07 €	30 258,12 €
22	OPERE IN C.A.O.	15,48524%	89 408,45 €	27 444,79 €	56,03%	323 476,28 €	99 294,18 €
23	OPERE C.A.P.	17,461794 %	98 043,66 €	14 729,60 €	17,46%	98 043,66 €	14 729,60 €
24	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
25	OPERE STRUTTURALI DI SUPPORTO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
26	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
IMPIANTI MECCANICI		0,18%	1 209,24 €	249,25 €	0,50%	3 347,20 €	689,94 €
27	CENTRALE TERMICA	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
28	BMS	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
29	CLIMATIZZAZIONE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
30	RISCALDAMENTO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
31	AERAUICO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
32	IDRICOSANITARIO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
33	SCARICHI	3,78%	1 209,24 €	249,25 €	10,45%	3 347,20 €	689,94 €
34	ANTINCENDIO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		0,19%	1 516,14 €	397,50 €	0,19%	1 516,14 €	397,50 €
35	LOCALE TECNICO QGBT E LOCALI ANNESSI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
36	IMPIANTI DI TERRA	14,99%	1 516,14 €	397,50 €	14,99%	1 516,14 €	397,50 €
37	DISTRIBUZIONE PRIMARIA	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
38	IMPIANTI FM ILLUMINAZIONE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
39	IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI E EVAC	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
40	IMPIANTO FOTOVOLTAICO E CARICA AUTO	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
41	AREA ESTERNA ILLUMINAZIONE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
42	TRASMISSIONE DATI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
43	TVCC - CONTROLLO ACCESSI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
44	ANTINTRUSIONE	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
45	BMS	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €



46	APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
SICUREZZA		6,51%	6 479,97 €		13,83%	13 766,33 €	
47	SICUREZZA	6,51%	6 479,97 €		13,83%	13 766,33 €	

TOTALE		4,40%	215 682,23 €	47 551,49 €	18,87%	924 807,21 €	200 670,79 €
--------	--	-------	--------------	-------------	--------	--------------	--------------

Il presente SAL viene redatto in digitale e inviato all'impresa per la sottoscrizione e accettazione da parte dell'Appaltatore da restituire al Direttore Lavori entro 3 giorni dalla presentazione dello stesso.

A seguito della firma da parte dell'Appaltatore del presente SAL, questo verrà inviato al Responsabile del Procedimento per l'emissione del Certificato di Pagamento n.03, quale autorizzazione all'emissione della relativa fattura, secondo i termini e le modalità prescritte nel Contratto d'Appalto.

Si allegato alla presente:

- Allegato fotografico SAL03 per opere a tutto il 05.12.2025;
- Libretto delle misure SAL03 per opere a tutto il 05.12.2025;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 03 per opere a tutto il 05.12.2025;
- Registro di Contabilità aggiornato al SAL03 per opere a tutto il 05.12.2025;
- Sommario del Registro di Contabilità aggiornato al SAL03 per opere a tutto il 05.12.2025;


TORINO, 09.12.2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Antonio PRESICCE

Per condivisione ed accettazione
L'APPALTATORE
Geom. Francesco MANGONE

Visto
IL RUP Arch. Daniela GALLI

Per EDIL EUROPA s.r.l.
SOCIETA' A UNIPERSONALE
Corso Sestoione, 100 10158 TORINO
Partita IVA 04750120012

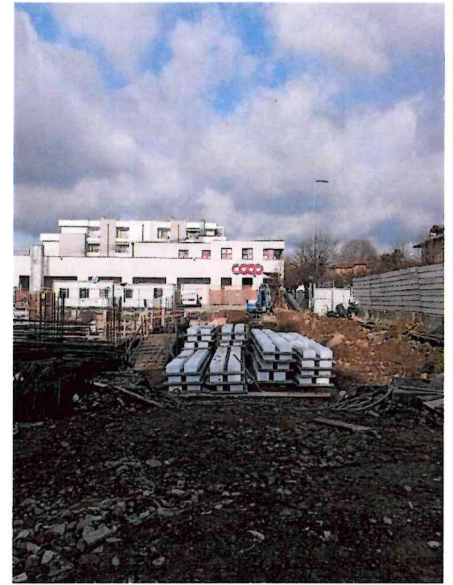







Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l. Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

LIBRETTO DELLE MISURE n. 03
ALLEGATO AL SAL N. 3 PER LAVORI A TUTTO IL 05/12/2025



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)							
38 001.001.002 v.001.001.00 2 05/12/2025	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI (voce pari a euro 14 955,62 - 0,311% dei lavori a corpo) SAL 03 SOMMANO % aliquota					40,00000 40,00000 (0,125%)		
39 001.001.006 v.001.001.00 6 05/12/2025	POLO CIVICO - OPERE EDILI - ISOLAMENTI E MEMBRANE (voce pari a euro 145 292,90 - 3,025% dei lavori a corpo) SAL 03 SOMMANO % aliquota					0,60529 0,60529 (0,018%)		
40 001.001.015 v.001.001.01 5 05/12/2025	POLO CIVICO - OPERE EDILI - OPERE DA POZZETTIERE (voce pari a euro 38 025,70 - 0,792% dei lavori a corpo) SAL 03 SOMMANO % aliquota					0,78770 0,78770 (0,006%)		
41 001.001.018 v.001.001.01 8 05/12/2025	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI (voce pari a euro 18 681,60 - 0,389% dei lavori a corpo) SAL 03 SOMMANO % aliquota					25,00000 25,00000 (0,097%)		
42 001.002.019 v.001.002.01 9 05/12/2025	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI (voce pari a euro 28 160,89 - 0,586% dei lavori a corpo) SAL 03 SOMMANO % aliquota					25,54305 25,54305 (0,150%)		
43 001.002.022 v.001.002.02 2 05/12/2025	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O. (voce pari a euro 577 378,35 - 12,022% dei lavori a corpo) SAL 03 SOMMANO % aliquota					15,48524 15,48524 (1,862%)		
44 001.002.023 v.001.002.02 3 05/12/2025	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.P. (voce pari a euro 561 475,31 - 11,691% dei lavori a corpo) SAL 03 SOMMANO % aliquota					17,46179 17,46179 (2,041%)		
45 001.004.033 v.001.004.03 3 05/12/2025	POLO CIVICO - IMPIANTI MECCANICI - SCARICHI (voce pari a euro 32 021,90 - 0,667% dei lavori a corpo) SAL 03 SOMMANO % aliquota					3,77629 3,77629 (0,025%)		
	A RIPORTARE							

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n. 03
ALLEGATO AL SAL N. 3 PER LAVORI A TUTTO IL 05/12/2025



Comune di Malnate (VA)

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 05/12/2025

OGGETTO: Realizzazione dell'intervento nuovo Polo Civico e riqualificazione urbana degli spazi esterni adiacenti.

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Edil Europa S.r.l.

Contratto in data 17/07/2024 rep. n. 9668 registrato a in data 22/07/2024 al n. di euro 4 266 294.19

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 796 444.24
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	01/10/2024	Importo per la Sicurezza:	99 541.48
Giorni Utili per Ultimazione:	473	Importo per la Manodopera:	1 136 459.24
Data Utile per Ultimazione:	17/01/2026	IMPORTO DI VARIANTE	4 902 090.92
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	99 541.48
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	1 113 969.30
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORIA CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)			
1 v.000	Arrotondamento SOMMANO % aliquote	100,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
2 001.001.001 v.001.001.00 1	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI SOMMANO % aliquote	91,96679	81 842,25 (1,704%)	75 267,69 (1,567%)
3 001.001.002 v.001.001.00 2	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	80,00000	14 955,62 (0,311%)	11 964,50 (0,249%)
4 001.001.006 v.001.001.00 6	POLO CIVICO - OPERE EDILI - ISOLAMENTI E MEMBRANE SOMMANO % aliquote	0,60529	145 292,90 (3,025%)	879,44 (0,018%)
5 001.001.015 v.001.001.01 5	POLO CIVICO - OPERE EDILI - OPERE DA POZZETTIERE SOMMANO % aliquote	5,38648	38 025,70 (0,792%)	2 048,25 (0,043%)
6 001.001.018 v.001.001.01 8	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI SOMMANO % aliquote	55,00000	18 681,60 (0,389%)	10 274,88 (0,214%)
7 001.002.019 v.001.002.01 9	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI SOMMANO % aliquote	25,54305	28 160,89 (0,586%)	7 193,15 (0,150%)
8 001.002.020 v.001.002.02 0	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI SOMMANO % aliquote	100,00000	80 209,63 (1,670%)	80 209,63 (1,670%)
9 001.002.021 v.001.002.02 1	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E MOVIMENTI TERRA SOMMANO % aliquote	99,99999	296 820,07 (6,180%)	296 820,04 (6,180%)
10 001.002.022 v.001.002.02 2	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O. SOMMANO % aliquote	56,02501	577 378,35 (12,022%)	323 476,27 (6,736%)
11 001.002.023 v.001.002.02 3	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.P. SOMMANO % aliquote	17,46179	561 475,31 (11,691%)	98 043,64 (2,041%)
12 001.004.033 v.001.004.03 3	POLO CIVICO - IMPIANTI MECCANICI - SCARICHI SOMMANO % aliquote	10,45285	32 021,90 (0,667%)	3 347,20 (0,070%)
	A RIPORTARE			909 524,69

COMMITTENTE: Comune di Malnate
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 05/12/2025

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri Manodopera non soggetti a ribasso euro 200'670,79 LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> PER LAVORI A CORPO euro COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro TOTALE euro <u>RIEPILOGO SAL</u> SAL n.1 A TUTTO IL 28/02/2025 euro 369 870.61 - differenza SAL precedente euro SAL n.2 A TUTTO IL 26/08/2025 euro 709 124.97 - differenza SAL precedente euro SAL n.3 A TUTTO IL 05/12/2025 euro 924 807.15 - differenza SAL precedente euro TOTALE euro Torino , 09/12/2025 L'Impresa Edil Europa S.r.l. Il Direttore dei Lavori Ing. Antonio PRESICCE  Per EDIL EUROPA s.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE Corso Sarmone, 100 - 10145 TORINO Partita IVA 0123456789			911 040,83 (18,970%) 911 040,83 13 766,32 924 807,15 369 870,61 339 254,36 215 682,18 924 807,15
	A RIPORTARE			



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI Direttore Lavori Generale:	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

REGISTRO DI CONTABILITA' n. 03
ALLEGATO AL SAL N. 3 PER LAVORI A TUTTO IL 05/12/2025

Dott. Ing. ANTONIO PRESICCE
n. 6938 W

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						709 124,97	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)							
38 001.001.002 v.001.001.00 2	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI SOMMANO % aliquote	---	---	40,00000		14 955,62 (0,311%)	5 982,25 (0,125%)	
39 001.001.006 v.001.001.00 6	POLO CIVICO - OPERE EDILI - ISOLAMENTI E MEMBRANE SOMMANO % aliquote	---	---	0,60529		145 292,90 (3,025%)	879,44 (0,018%)	
40 001.001.015 v.001.001.01 5	POLO CIVICO - OPERE EDILI - OPERE DA POZZETTIERE SOMMANO % aliquote	---	---	0,78770		38 025,70 (0,792%)	299,53 (0,006%)	
41 001.001.018 v.001.001.01 8	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI SOMMANO % aliquote	---	---	25,00000		18 681,60 (0,389%)	4 670,40 (0,097%)	
42 001.002.019 v.001.002.01 9	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI SOMMANO % aliquote	---	---	25,54305		28 160,89 (0,586%)	7 193,15 (0,150%)	
43 001.002.022 v.001.002.02 2	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O. SOMMANO % aliquote	---	---	15,48524		577 378,35 (12,022%)	89 408,42 (1,862%)	
44 001.002.023 v.001.002.02 3	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.P. SOMMANO % aliquote	---	---	17,46179		561 475,31 (11,691%)	98 043,64 (2,041%)	
45 001.004.033 v.001.004.03 3	POLO CIVICO - IMPIANTI MECCANICI - SCARICHI SOMMANO % aliquote	---	---	3,77629		32 021,90 (0,667%)	1 209,24 (0,025%)	
46 001.005.036 v.001.005.03 6	POLO CIVICO - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTI DI TERRA SOMMANO % aliquote	---	---	14,99088		10 113,75 (0,211%)	1 516,14 (0,032%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						209 202,21 (4,356%)	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						918 327,18	



Regione	Lombardia
Comune di	Malnate (VA)
Committente S.A.	Comune di Malnate (VA) - Piazza Vittorio Veneto n.2
RUP/R.L.	Arch. Daniela GALLI - Responsabile Area Pianificazione del Territorio
Lavori di	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI ADIACENTI
CIG	B0D4DC26D4
CUP	B23B19000220004
Appaltatore	Edil Europa S.r.l Corso Sempione n. 130, Torino. REA 797750, CF e P.IVA: 03117750012.
Tipo di contratto	A corpo – stipulato ai sensi del D.Lgs 36/2023
Contratto Lavori	Repertorio 9668 firmato in data 17.07.2024
Ribasso unico	14,89% da applicarsi all'importo a base di gara assoggettabile a ribasso
Importo contrattuale d'appalto:	Nuovo importo contrattuale a corpo a seguito di PdV01 € 4.352.861,34 oltre IVA di cui € 99.541,48 per oneri della sicurezza e € 1.113.969,30 per costi della manodopera non assoggettati a ribasso
Tempo per l'esecuzione lavori:	473 gg naturali e consecutivi con decorrenza da Verbale di Consegna Definitivo, prorogati di 46 gg naturali e consecutivi per effetto della PdV01
Ufficio di DIREZIONE LAVORI	RTP: 3+Progetti srl (mandataria); DAP studio, Colletti Ingegneria
Direttore Lavori Generale:	Ing. Antonio PRESICCE - 3+Progetti srl (mandataria) Corso Re Umberto 48 – 10128 Torino – malnate@3piuprogetti.it
Consegna Lavori e Ultimazione	Verbale Consegna Lavori Definitiva 01.10.2024 con ultimazione prorogata al 04.03.2026 per effetto della PdV01

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	3.560.443,52
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€	4.796.444,24
RIBASSO D'ASTA		14,89%

CONTRATTO APPALTO Rep. n. 9668 del 17.07.2024		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€	3.030.293,47
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.136.459,24
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€	4.266.294,19

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 DET. 540 del 19.08.2025		
IMPORTO LAVORI CONTRATTO POST PDV01	€	3.139.350,56
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	99.541,48
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.113.969,30
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO POST PDV01	€	4.352.861,34

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' n. 03
ALLEGATO AL SAL N. 3 PER LAVORI A TUTTO IL 05/12/2025



SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Realizzazione dell'intervento nuovo Polo Civico e riqualificazione urbana degli spazi esterni adiacenti.

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Edil Europa S.r.l.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Antonio PRESICCE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4 696 902,76 - 100%)					
1	Arrotondamento	1	8	100,00000		0,01
000				100,00000		0,01
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	25	-100,00000		(0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		-0,01
						0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,00000	0,01 (0,000%)	0,00 (0,000%)
2	ODS 07- SMALTIMENTO TERRE (65% DI 3600MC)	1	6	100,00000		90 698,40
ODS 07				100,00000		90 698,40
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	21	-100,00000		(1,931%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		-90 698,40
						0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,00000	90 698,40 (1,931%)	0,00 (0,000%)
3	ODS 08 - BONIFICHE SERBATOI	1	7	100,00000		25 387,90
ODS_08_BO				100,00000		25 387,90
NIFICHE SE	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	23	-100,00000		(0,541%)
RBATOI	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		-25 387,90
						0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,00000	25 387,90 (0,541%)	0,00 (0,000%)
4	ODS 08 - STRALCI BONIFICHE	1	10	100,00000		-6 579,60
ODS_08_ST	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	27	-100,00000		-6 579,60
RALCI BON	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		(-0,140%)
IFICHE						6 579,60
						0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,00000	-6 579,60 (-0,140%)	0,00 (0,000%)
5	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI	1	1	91,63292		55 097,07
001.001.001				91,63292		55 097,07
001.001.001	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	11	-91,63292		(1,173%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		-55 097,07
						0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,00000	60 128,03 (1,280%)	0,00 (0,000%)
6	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI	1	2	15,00000		2 802,24
001.001.018				15,00000		2 802,24
001.001.018	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	13	-15,00000		(0,060%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		-2 802,24
						0,00
						(0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			0,00000	18 681,60 (0,398%)	0,00 (0,000%)
7	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI	1	3	100,00000		79 086,43
001.002.020				100,00000		79 086,43
001.002.020	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	15	-100,00000		(1,684%)
	al S.A.L. n. 2			0,00000		-79 086,43
						0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 4 802 549,44 - 100%)					
10 v.ODS 07	ODS 07- SMALTIMENTO TERRE (65% DI 3600MC)					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	22	0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000 0,00000		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
11 v.ODS_08_B ONIFICHE S ERBATOI	ODS 08 - BONIFICHE SERBATOI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	24	0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000 0,00000		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
12 v.000	Arrotondamento					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	26	0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			100,00000 100,00000		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			100,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
13 v.ODS_08_S TRALCI BO NIFICHE	ODS 08 - STRALCI BONIFICHE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	28	0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000 0,00000		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,00000	0,00 (0,000%)	0,00 (0,000%)
14 001.001.001 v.001.001.00 1	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	12	0,00000		0,00 (0,000%)
		2	29	90,30222 1,66457		73 905,37 1 362,32
	al S.A.L. n. 2 aliquota			91,96679		75 267,69 (1,567%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			91,96679	81 842,25 (1,704%)	75 267,69 (1,567%)
15 001.001.002 v.001.001.00 2	POLO CIVICO - OPERE EDILI - DRENAGGI E RINTERRI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	30	0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	3	38	40,00000 40,00000		5 982,25 5 982,25 (0,125%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			80,00000	14 955,62 (0,311%)	11 964,50 (0,249%)
16 001.001.006 v.001.001.00 6	POLO CIVICO - OPERE EDILI - ISOLAMENTI E MEMBRANE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota	3	39	0,00000 0,60529		0,00 (0,000%) 879,44
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota			0,60529	145 292,90 (3,025%)	879,44 (0,018%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
17 001.001.015 v.001.001.015	POLO CIVICO - OPERE EDILI - OPERE DA POZZETTIERE					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
		2	31	4,59878		1 748,72
	al S.A.L. n. 2 aliquota			4,59878		1 748,72 (0,036%)
		3	40	0,78770		299,53
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			5,38648	38 025,70 (0,792%)	2 048,25 (0,043%)
18 001.001.018 v.001.001.018	POLO CIVICO - OPERE EDILI - NOLEGGI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
		2	14	15,00000		2 802,24
		2	32	15,00000		2 802,24
	al S.A.L. n. 2 aliquota			30,00000		5 604,48 (0,117%)
		3	41	25,00000		4 670,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			55,00000	18 681,60 (0,389%)	10 274,88 (0,214%)
19 001.002.019 v.001.002.019	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
		3	42	25,54305		7 193,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			25,54305	28 160,89 (0,586%)	7 193,15 (0,150%)
20 001.002.020 v.001.002.020	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
		2	16	98,59967		79 086,43
		2	33	1,40033		1 123,20
	al S.A.L. n. 2 aliquota			100,00000		80 209,63 (1,670%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			100,00000	80 209,63 (1,670%)	80 209,63 (1,670%)
21 001.002.021 v.001.002.021	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E MOVIMENTI TERRA					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
		2	18	55,78850		165 591,46
		2	34	44,21149		131 228,58
	al S.A.L. n. 2 aliquota			99,99999		296 820,04 (6,180%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			99,99999	296 820,07 (6,180%)	296 820,04 (6,180%)
22 001.002.022 v.001.002.022	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.O.					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
		2	20	7,42906		42 893,78
		2	35	33,11071		191 174,07
	al S.A.L. n. 2 aliquota			40,53977		234 067,85 (4,874%)
		3	43	15,48524		89 408,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			56,02501	577 378,35 (12,022%)	323 476,27 (6,736%)
23 001.002.023 v.001.002.023	POLO CIVICO - OPERE STRUTTURALI - OPERE IN C.A.P.					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00000		0,00 (0,000%)
		3	44	17,46179		98 043,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			17,46179	561 475,31 (11,691%)	98 043,64 (2,041%)

[illegible]

